FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

1.- INFORMACIÓN BÁSICA

2920

INICIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: *10-jul-26* CLAVE(S) : ***FISM2608008***

A.- UBICACIÓN

MUNICIPIO: *CUAPIAXTLA*
LOCALIDAD: *BARRIO SAN ANTONIO*
UBICACIÓN: *CAMINO AL POZO*
ENTRE: *CAMINO A IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES*

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

B. OBRA A REALIZAR

NOMBRE: *AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA*

DESCRIPCIÓN DE METAS: *TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS EN LINEAS AEREAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS*

UNIDAD DE MEDIDA: *ML* CANTIDAD: *420.00*

C.- APERTURA PROGRAMÁTICA

RUBRO: *ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES*
33 LCF:
SUBCLASIFICACIÓN: *RED DE ELECTRIFICACION (PIR)*
MODALIDAD POR TIPO INCIDENCIA: *AMPLIACIÓN DIRECTA*

D.- BENEFICIARIOS

DIRECTOS: *180* **HAB. DE LA LOCALIDAD:** *1,271*

E.- INVERSIÓN

RECURSO	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
MONTO AUTORIZADO	$ 620,496.49	$ 620,496.49	0.00	0.00

FORMA DE APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: *NINGUNA*

F.- EJECUCIÓN

MODALIDAD: *INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS*

PERIODO: *INICIO - TERMINO* DEL *06 DE JULIO DE 2026* AL *10 DE JULIO DE 2026*

DEPENDENCIA EJECUTORA

OBRAS PÚBLICAS
CUAPIAXTLA, TLAX.
2024 - 2027

C.P ALMA LORENA ESCOBAR GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING.DIANA LAURA SALGADO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)


MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA 2921
EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

CLAVE(S) : **FISM2608008**

2.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

MUNICIPIO:	CUAPIAXTLA
LOCALIDAD:	BARRIO SAN ANTONIO
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
UBICACIÓN:	CAMINO AL POZO
ENTRE:	CAMINO A IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

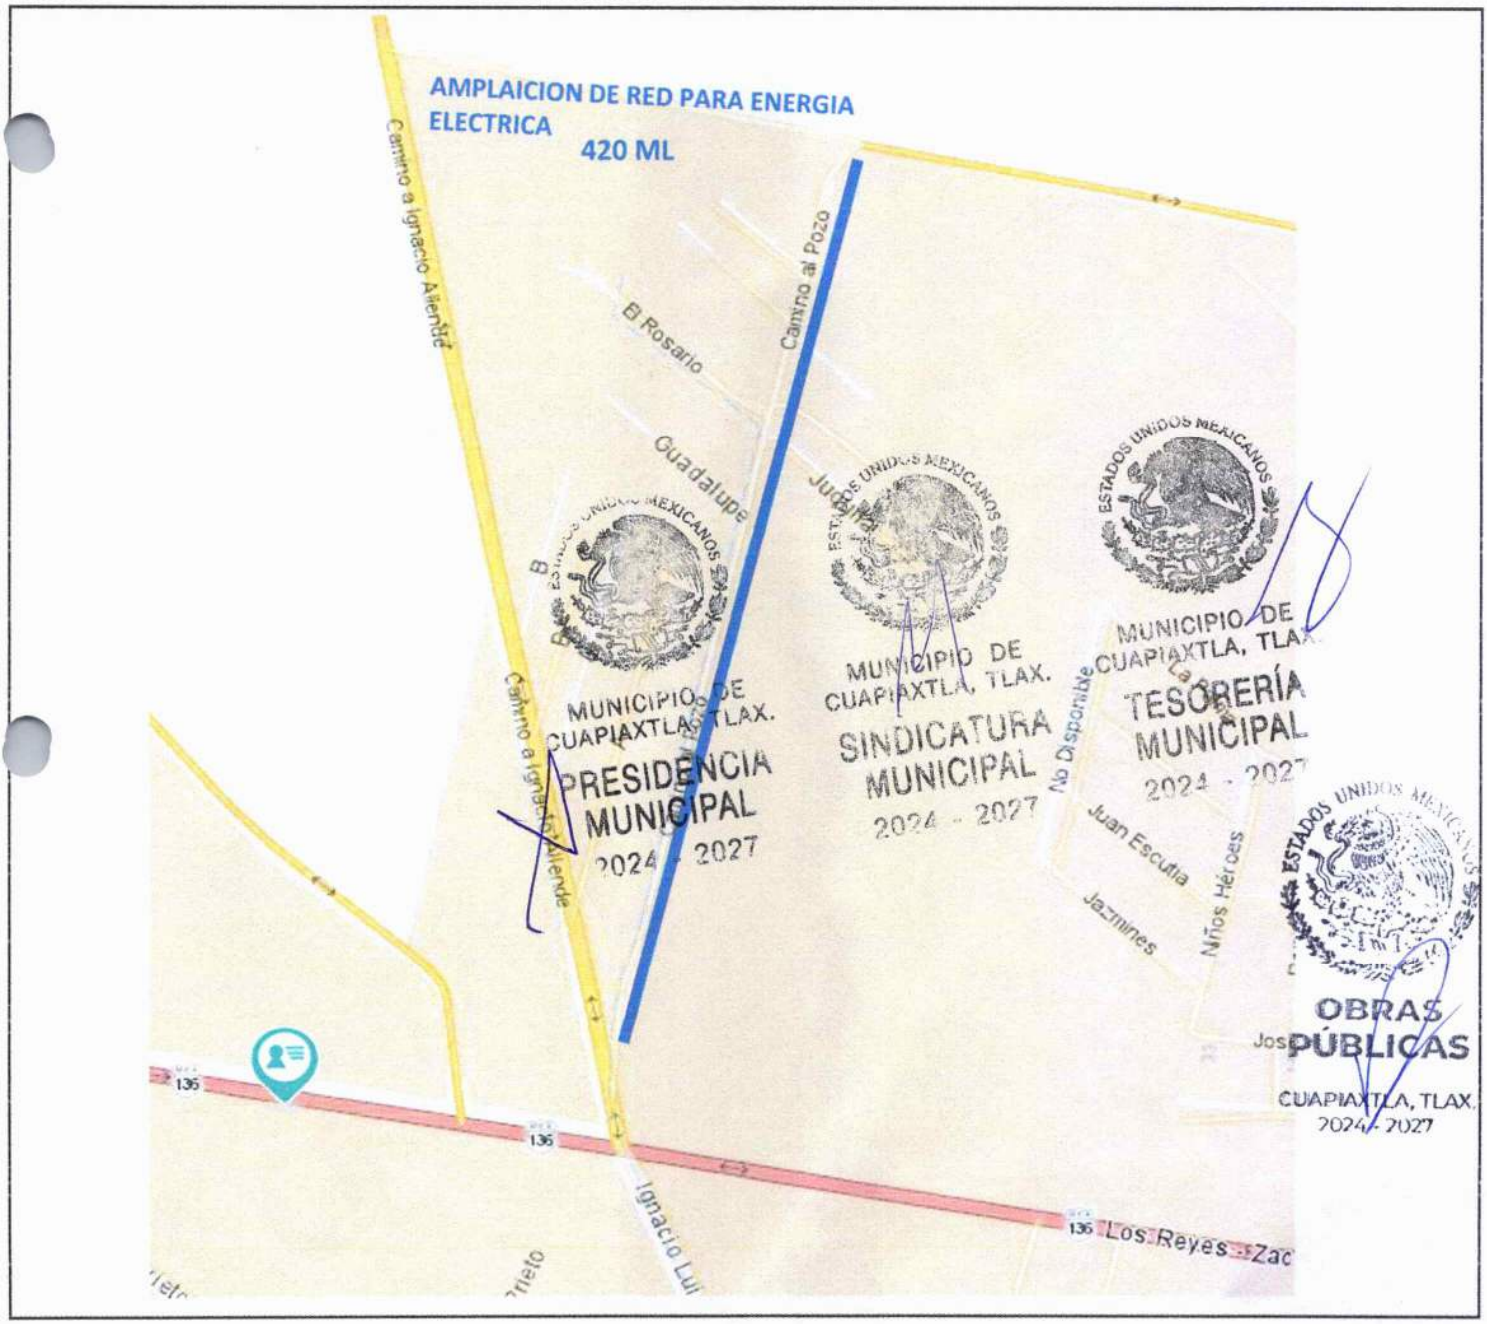

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA
EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO


2922

CLAVE(S) : **FISM2608008**

3.- CROQUIS DE MICRO LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

MUNICIPIO:	CUAPIAXTLA
LOCALIDAD:	BARRIO SAN ANTONIO
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
UBICACIÓN:	CAMINO AL POZO
ENTRE:	CAMINO A IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

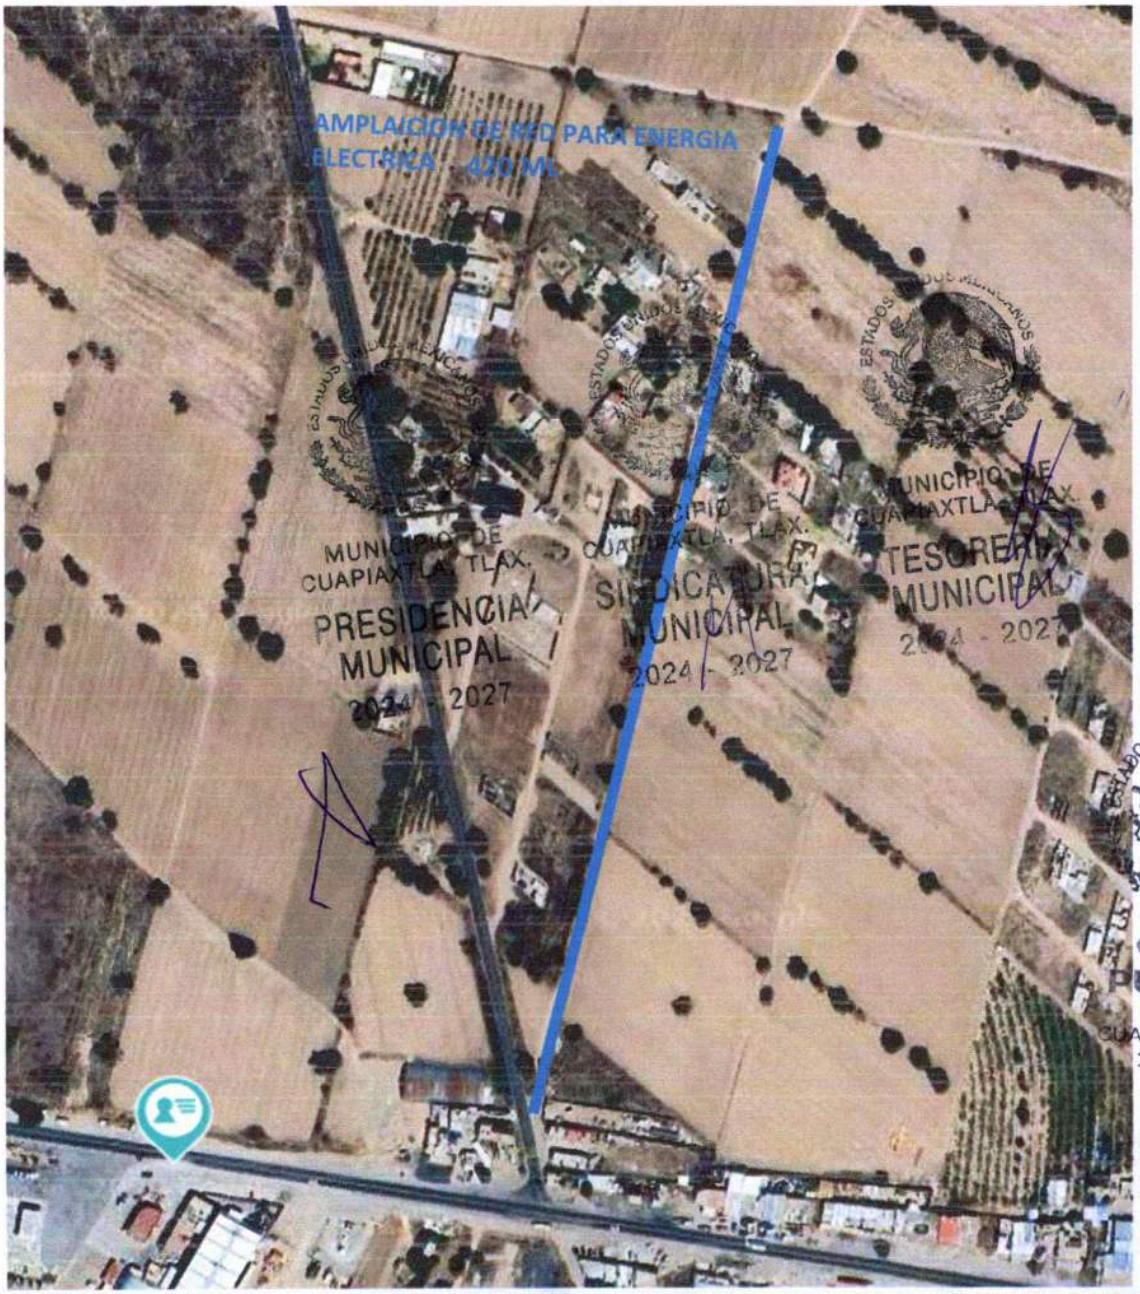

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO 2923

CLAVE(S) : **FISM2608008**

4.- DETALLES DE LA OBRA


MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: BARRIO SAN ANTONIO
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
UBICACIÓN: CAMINO AL POZO
ENTRE: CAMINO A IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES


"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS EN LINEAS AEREAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS





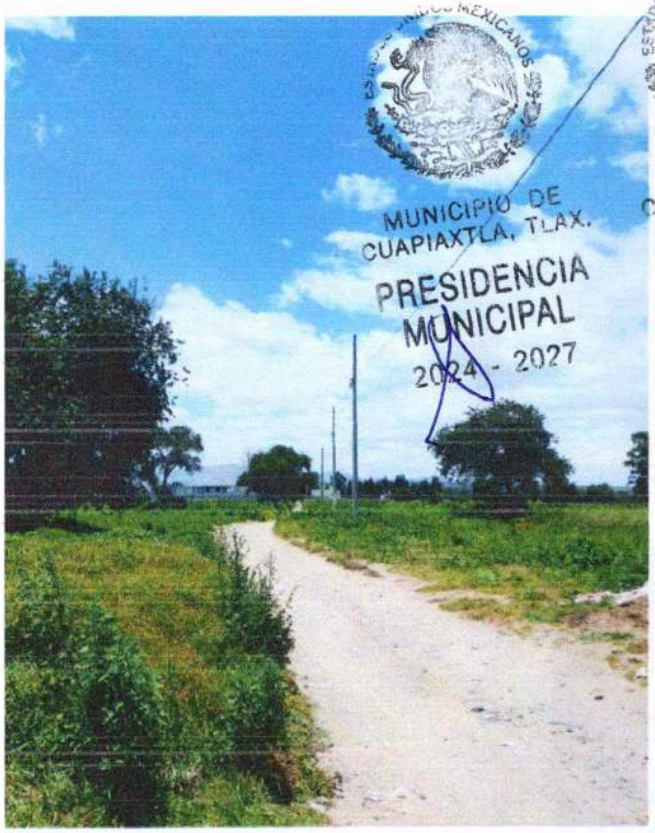

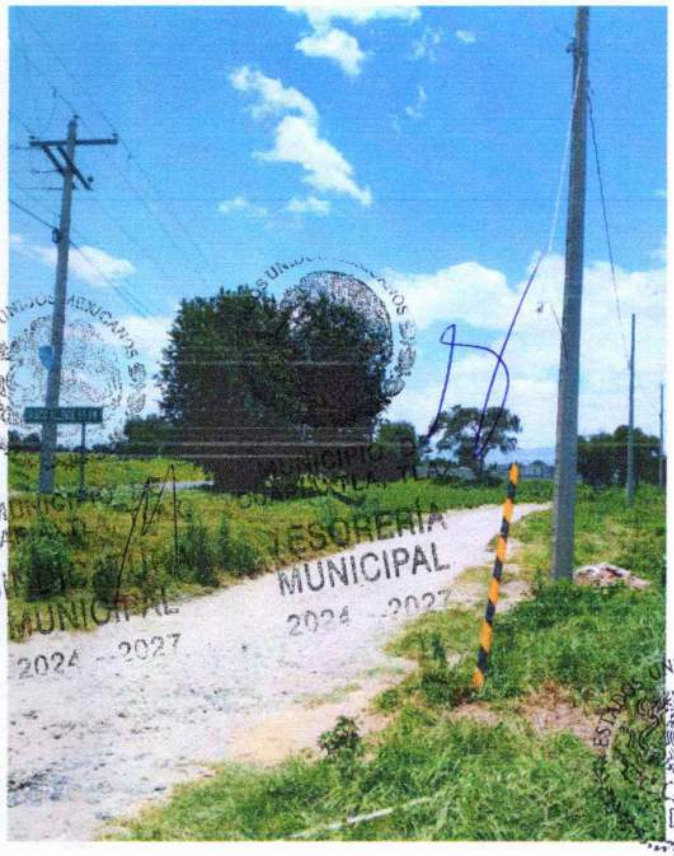

OBRAS PÚBLICAS
CUAPIAXTLA, TLAX.
2024 - 2027

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

CLAVE(S) : **FISM2608008**

6.- RESUMEN DE CONCEPTOS O PARTIDAS

MUNICIPIO:	CUAPIAXTLA
LOCALIDAD:	BARRIO SAN ANTONIO
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
UBICACIÓN:	CAMINO AL POZO
ENTRE:	CAMINO A IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE
A0101	TRABAJOS PRELIMINARES	**$ 534,910.77**
	SUBTOTAL	$ 534,910.77
	IVA:	**$85,585.72**
	TOTAL:	**$620,496.49**

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS CUAPIAXTLA, TLAX. 2024 - 2027

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL"

2925

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM 2026)
MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA
EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

CLAVE(S) : **FISM2608008**

7.-CALENDARIO DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: BARRIO SAN ANTONIO
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
UBICACIÓN: CAMINO AL POZO
ENTRE: CAMINO A IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES

CLAVE	PARTIDAS	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
A0101	TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%	06 DE JULIO DE 2026	10 DE JULIO DE 2026
		100.00%		

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS
CUAPIAXTLA, TLAX.
2024 - 2027

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA
EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

CLAVE(S) : **FISM2608008**

5.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: BARRIO SAN ANTONIO
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
UBICACIÓN: CAMINO AL POZO
ENTRE: CAMINO A IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN ANDRES

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
A01	**AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA**				534,910.77
A0101	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	420.00	$13.08	$5,493.60
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODO SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL No. 4 PARA TIERRA FISICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	$2,228.71	$17,829.68
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 13-600 MTS INCLUYE FLETE, EXCAVACIÓN DE CEPA, ERECCIÓN Y PLOMEADO DEL MISMO ASÍ COMO MANIOBRAS CON GRÚA HUAR.	PZA	9.00	$14,416.85	$129,751.65
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 13-600 MTS PARA ALUMBRADO (2015) INCLUYE FLETE, EXCAVACIÓN DE CEPA, ERECCIÓN Y PLOMEADO DEL MISMO ASÍ COMO MANIOBRAS CON GRÚA HUAR.	PZA	3.00	$12,253.56	$36,760.68
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES PARA VESTIR POSTES EN MEDIA TENSION A UNA FASE Y SECUNDARIO.	PZA	9.00	$7,960.63	$71,645.67
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS COMPLETAS PARA BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	$6,166.98	$30,834.90
7	TENDIDO DE LÍNEAS AÉREAS EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE AL-ACSR (2+1) 3[illegible] 1/0, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	335.50	$331.76	$111,305.48
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTA CIRCUITOS CCF-27-100-150-6000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$6,763.69	$6,763.69
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 1T-DA-F-10 KVA13200YT/7620-120/240 (AUTOPROT) MARCA PROLEC O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00	$59,219.18	$59,219.18
10	TRAMITE ANTE C.F.E. INCLUYE; GESTION, SUPERVICION DE LA OBRA, PLANO Y LIBERACION DE LA OBRA.	TRAMITE	1.00	$16,838.72	$16,838.72
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LED DE 60W MODELO LFDY INCLUYE; BRAZO DE 1 1/1" X 1.20 MTS DE LONGITUD CON FOTOCELDA RECEPTACULO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIÓN DE LUMINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$3,555.56	$42,666.72
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 1+1 DE ALUMINIO CAL. 6 AEREO (BAJADA) PARA ALUMBRADO; INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TIDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	120.00	$48.34	$5,800.80
				SUBTOTAL:	**$ 534,910.77**
				IVA:	**$85,585.72**
				TOTAL:	**$620,496.49**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027
MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027
OBRAS PUBLICAS CUAPIAXTLA, TLAX 2024 - 2027
