FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA
EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

1.- INFORMACIÓN BÁSICA

FINAL

FECHA DE ELABORACIÓN: *24 DE JULIO DE 2026* CLAVE(S) : ***FISM2608016***

A.- UBICACIÓN

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

3501

MUNICIPIO: *CUAPIAXTLA*
LOCALIDAD: *CUAPIAXTLA*
UBICACIÓN: *CALLE TEQUITL*
ENTRE: *CALLE ZITLAI*

B. OBRA A REALIZAR

NOMBRE: *CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO*

DESCRIPCIÓN DE METAS: *TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA, LOSA BASE IMPERMEABLE, MUROS CONCRETO ARMADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO, TAPAS DE ACERO Y LIMPIEZA*

UNIDAD DE MEDIDA: *M2* 78.25

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C.- APERTURA PROGRAMÁTICA

RUBRO: *DRENAJE Y LETRINAS*
33 LCF: *DRE*
SUBCLASIFICACIÓN: *VASO REGULADOR*
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: *CONSTRUCCION*
INCIDENCIA: *DIRECTA*

D.- BENEFICIARIOS

DIRECTOS: *120* **HAB. DE LA LOCALIDAD:** *120*

E.- INVERSIÓN

RECURSO	TOTAL	FEDERAL 2026	ESTATAL	BENEFICIARIOS
MONTO AUTORIZADO	**$ 504,467.37**	**$ 504,467.37**	**0.00**	**0.00**

FORMA DE APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: *NINGUNA*

F.- EJECUCIÓN

MODALIDAD: *ADJUDICACION DIRECTA*

PERIODO: *INICIO - TERMINO DEL 05 DE JUNIO DEL 2026 AL 24 DE JULIO DEL 2026*

DEPENDENCIA EJECUTORA

C. P. ALMA LORENA ESCOBAR GONZÁLEZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAPIAXTLA, TLAX. 2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS CUAPIAXTLA, TLAX. 2024 - 2027

CP. ALMA LORENA ESCOBAR GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. DIANA LAURA SALGADO SANCHEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

3502

CLAVE(S) : **FISM2608016**

2.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

MUNICIPIO:	CUAPIAXTLA
LOCALIDAD:	CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO
UBICACIÓN:	*CALLE TEQUITL*
ENTRE:	CALLE ZITLAI

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"



3.- CROQUIS DE MICRO LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO


UBICACIÓN: CALLE TEQUITL
ENTRE: CALLE ZITLAI

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027



"CONSTRUCCION DE VASO



OBRAS PÚBLICAS
CUAPIAXTLA, TLAX

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO


CLAVE(S) : **FISM2608016**

4.- DETALLES DE LA OBRA

3504

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO
UBICACIÓN: *CALLE TEQUITL*
ENTRE: CALLE ZITLAI

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA, LOSA BASE IMPERMEABLE, MUROS CONCRETO ARMADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO, TAPAS DE ACERO Y LIMPIEZA.

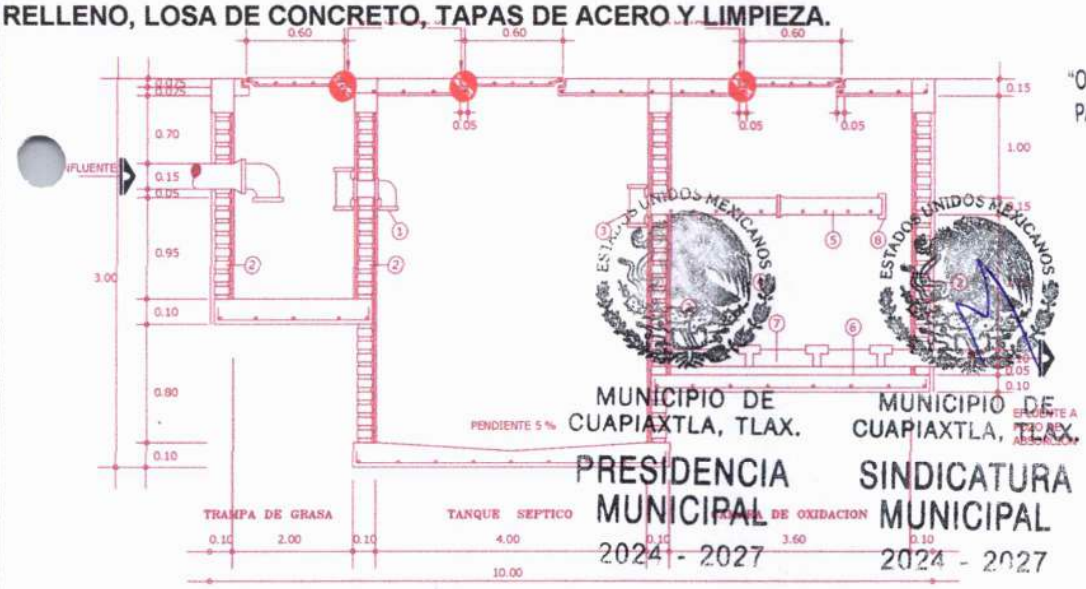

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"


MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS

FOSA SEPTICA

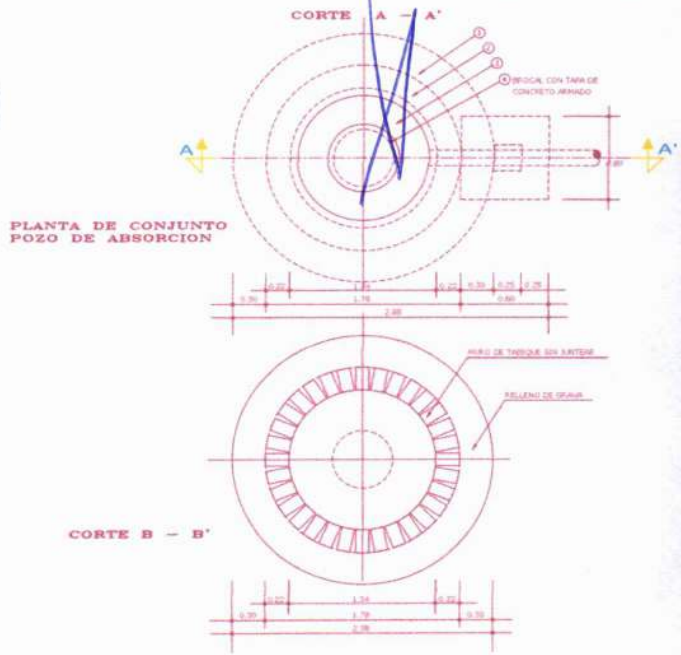



FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO 3505

CLAVE(S) : **FISM2608016**

5.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO
UBICACIÓN: CALLE TEQUITL
ENTRE: CALLE ZITLAI

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
A01	**CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO**				434,885.66
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE FOSA INCLUYE: ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	78.25	$12.29	$961.69
2	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F"C=100KG/CM2 TMA=19MM DE 5 CM DE ESPESOR EN FOSA INCLUYE: BOMBA, ACOMODO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	273.88	$191.36	$52,409.68
3	CARGA Y ACARREO DE CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA DE 1ER KM, INCLUYE CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	48.25	$235.61	$11,368.18
4	RELLENO DE HUECOS CON MATERIAL HUMEDECIDO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 15CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	143.70	$129.54	$18,621.60
5	PISO DE CONCRETO IMPERMEABLE F"C=250KG/CM2 TMA 19MM DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA F'Y=4200KG/CM2 DEL #4 @ 15CM AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO SUPERIOR, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, UNION DE JUNTA FRIA CON BANDADE PVC DE 20 CM DE ANCHO EN FONDO Y PERIFERIA DE FOSA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	156.85	$152.47	$23,914.92
6	MURO DE CONTENCION PARA FOSA SEPTICA A BASE DE CONCRETO F"C=250KG/CM2 TMA 19MM CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA #4 @15CM EN EL SENTIDO VERTICAL Y #4 15 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	36.00	$1,375.92	$49,533.12
7	MURO DE CONTENCION PARA FOSA SEPTICA A BASE DE CONCRETO F"C=250KG/CM2 TMA 19MM CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA #4 @15CM EN EL SENTIDO VERTICAL Y #4 15 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	71.64	$2,385.30	$170,882.89
8	LOSA TAPA DE CONCRETO IMPERMEABLE F"C=250KG/CM2 TMA=19MM DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA F'C=4200KG DEL #4 @15 CM AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO SUPERIOR, INLCUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	34.92	$1,814.67	$63,368.28
9	TAPA METALICA PARA REGISTRO A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 6 DE 60CM X 60CM, INCLUYE: AGARRADERA DE REDONDO LISO DE 1.6CM DE DIAMETRO CED.40. ANGULO DE 1-1/2"X 1/8" CONTRAMARCO, ANCLAJES PINTURA, ANTICORROSIVA Y ESMALTE , MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$2,768.39	$8,305.17
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 6" DE DIAMETRO (ANGER) DENTRO DE FOSA SEPTICA, "TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$1,568.71	$4,706.13

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS CUAPIAXTLA, TLAX. 2024 - 2027

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO 3506

CLAVE(S) : **FISM2608016**

5.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO
UBICACIÓN: CALLE TEQUITL
ENTRE: CALLE ZITLAI

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
11	POZO DE ABSORCION CON TABIQUE AHUECALADO HASTA UNA ALTURA DE 4.80M APROX, ANTES DEL TUBO DE LLEGADA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 HASTA UN NIVEL DE TERRENO, MATERIALES DIVERSOS DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE COMO PIEDRA GRUESA, GRAVA, ARENA INCLUYE: EXCAVACION, CHANFLES, ACABADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	POZO	1.00	$ 28,636.12	$28,636.12
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 3,477.88	$3,477.88

SUBTOTAL:	**$ 434,885.66**
IVA:	**$69,581.71**
TOTAL:	**$504,467.37**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OBRAS PUBLICAS
CUAPIAXTLA, TLAX
2024 - 2027

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO 3507

CLAVE(S) : **FISM2608016**

6.- RESUMEN DE CONCEPTOS O PARTIDAS

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO
UBICACIÓN: CALLE TEQUITL
ENTRE: CALLE ZITLAI

CLAVE	SUBPARTIDAS	IMPORTE
A01	**CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO**	**434,885.66**
1.0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE FOSA INCLUYE: ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	$ 961.69
2.0	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100KG/CM2 TMA=19MM DE 5 CM DE ESPESOR EN FOSA, INCLUYE: BOMBEO, ACOMODO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	$ 52,409.68
3.0	CARGA Y ACARREO DE CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA DE 1ER KM, INCLUYE CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 11,368.18
4.0	RELLENO DE HUECOS CON MATERIAL HUMEDECIDO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 15CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 17,321.60
5.0	PISO DE CONCRETO IMPERMEABLE F"C=250KG/CM2 TMA 19MM DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA F'Y=4200KG/GM2 DEL #4 @ 15CM AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO SUPERIOR, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, UNION DE JUNTA FRIA CON BANDADE PVC DE 20 CM DE ANCHO EN FONDO Y PERIFERIA DE FOSA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 23,914.92
6.0	MURO DE CONTENCION PARA FOSA SEPTICA A BASE DE CONCRETO F"C=250KG/CM2 TMA 19MM CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA #4 @15CM EN EL SENTIDO VERTICAL Y #4 15 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 49,533.12
7.0	MURO DE CONTENCION PARA FOSA SEPTICA A BASE DE CONCRETO F"C=250KG/CM2 TMA 19MM CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA #4 @15CM EN EL SENTIDO VERTICAL Y #4 15 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 170,882.89
8.0	LOSA TAPA DE CONCRETO IMPERMEABLE F"C=250KG/CM2 TMA=19MM DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA F'C=4200KG DEL #4 @15 CM AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO SUPERIOR, INLCUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y MANO DE OBRA.	$ 63,368.28
9.0	TAPA METALICA PARA REGISTRO A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 6 DE 60CM X 60CM, INCLUYE: AGARRADERA DE REDONDO LISO DE 1.6CM DE DIAMETRO CED.40. ANGULO DE 1-1/2"X 1/8" CONTRAMARCO, ANCLAJES PINTURA, ANTICORROSIVA Y ESMALTE , MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 8,305.17
10.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 6" DE DIAMETRO (ANGER) DENTRO DE FOSA SEPTICA, "TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 4,706.13

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS CUAPIAXTLA, TLAX. 2024 - 2027

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

3508

CLAVE(S) : **FISM2608016**

6.- RESUMEN DE CONCEPTOS O PARTIDAS

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO
UBICACIÓN: CALLE TEQUITL
ENTRE: CALLE ZITLAI

CLAVE	SUBPARTIDAS	IMPORTE
11.0	POZO DE ABSORCION CON TABIQUE AHUECALADO HASTA UNA ALTURA DE 4.80M APROX, ANTES DEL TUBO DE LLEGADA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 HASTA UN NIVEL DE TERRENO, MATERIALES DIVERSOS DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE COMO PIEDRA GRUESA, GRAVA, ARENA INCLUYE: EXCAVACION, CHANFLES, ACABADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	$ 28,636.12
12.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$ 3,477.88
	SUBTOTAL:	**$ 434,885.66**
	IVA:	**$69,581.71**
	TOTAL:	**$ 504,467.37**

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

OBRAS PUBLICAS
CUAPIAXTLA, TLAX.
2024 - 2027

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

3509

CLAVE(S) : **FISM2608016**

7.-CALENDARIO DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO
UBICACIÓN: CALLE TEQUITL
ENTRE: CALLE ZITLAI

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

CLAVE	SUBPARTIDAS	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
A01	**CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO**	100.00%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
1.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE FOSA INCLUYE: ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	0.22%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
2.00	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100KG/CM2 TMA=19MM DE 5 CM DE ESPESOR EN FOSA INCLUYE: BOMBA, ACOMODO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2.05%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
3.00	CARGA Y ACARREO DE CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA DE 1ER KM, INCLUYE CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, *HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.*	2.61%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
4.00	RELLENO DE HUECOS CON MATERIAL HUMEDECIDO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3.98%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
5.00	PISO DE CONCRETO IMPERMEABLE F'C=250KG/CM2 TMA 19MM DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA FY=4200KG/CM2 DEL #4 @ 15CM AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO SUPERIOR, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, UNION DE JUNTA FRIA CON BANDADE PVC DE 20 CM DE ANCHO EN FONDO Y PERIFERIA DE FOSA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	5.50%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
6.00	MURO DE CONTENCION PARA FOSA SEPTICA A BASE DE CONCRETO *F'C=250KG/CM2 TMA 19MM CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 10CM* DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA #4 @15CM EN EL SENTIDO VERTICAL Y #4 15 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	11.39%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
7.00	MURO DE CONTENCION PARA FOSA SEPTICA A BASE DE CONCRETO *F'C=250KG/CM2 TMA 19MM CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 10CM* DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA #4 @15CM EN EL SENTIDO VERTICAL Y #4 15 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	39.29%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
8.00	LOSA TAPA DE CONCRETO IMPERMEABLE F'C=250KG/CM2 TMA=19MM DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA F'C=4200KG DEL #4 @15 CM *AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO SUPERIOR, INLCUYE IMPERMEABILIZANTE* INTEGRAL, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y MANO DE OBRA.	14.57%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
9.00	TAPA METALICA PARA REGISTRO A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 6 DE 60CM X 60CM, INCLUYE: AGARRADERA DE REDONDO LISO DE 1.6CM DE DIAMETRO CED.40. ANGULO DE 1-1/2"X 1/8" CONTRAMARCO, ANCLAJES PINTURA, ANTICORROSIVA Y ESMALTE , MATERIAL MENOR, HERRAMIENTA, *EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA* EJECUCION.	1.91%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**
10.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 6" DE DIAMETRO (ANGER) DENTRO DE FOSA SEPTICA, "TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.08%	**15 DE JUNIO DEL 2026**	**24 DE JULIO DEL 2026**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
OBRAS PÚBLICAS
CUAPIAXTLA, TLAX

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2026)

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA

EXPEDIENTE TÉCNICO FINIQUITO

3510

CLAVE(S) : **FISM2608016**

7.-CALENDARIO DE EJECUCIÓN

"OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"

MUNICIPIO: CUAPIAXTLA
LOCALIDAD: CUAPIAXTLA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR EN N.C.P SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO
UBICACIÓN: CALLE TEQUITL
ENTRE: CALLE ZITLAI

CLAVE	SUBPARTIDAS	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
11.00	POZO DE ABSORCION CON TABIQUE AHUECALADO HASTA UNA ALTURA DE 4.80M APROX, ANTES DEL TUBO DE LLEGADA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 HASTA UN NIVEL DE TERRENO, MATERIALES DIVERSOS DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE COMO PIEDRA GRUESA, GRAVA, ARENA INCLUYE: EXCAVACION, CHANFLES, ACABADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	6.58%	15 DE JUNIO DEL 2026	24 DE JULIO DEL 2026
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.80%	15 DE JUNIO DEL 2026	24 DE JULIO DEL 2026
		100%		

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS
CUAPIAXTLA, TLAX.
2024 - 2027
